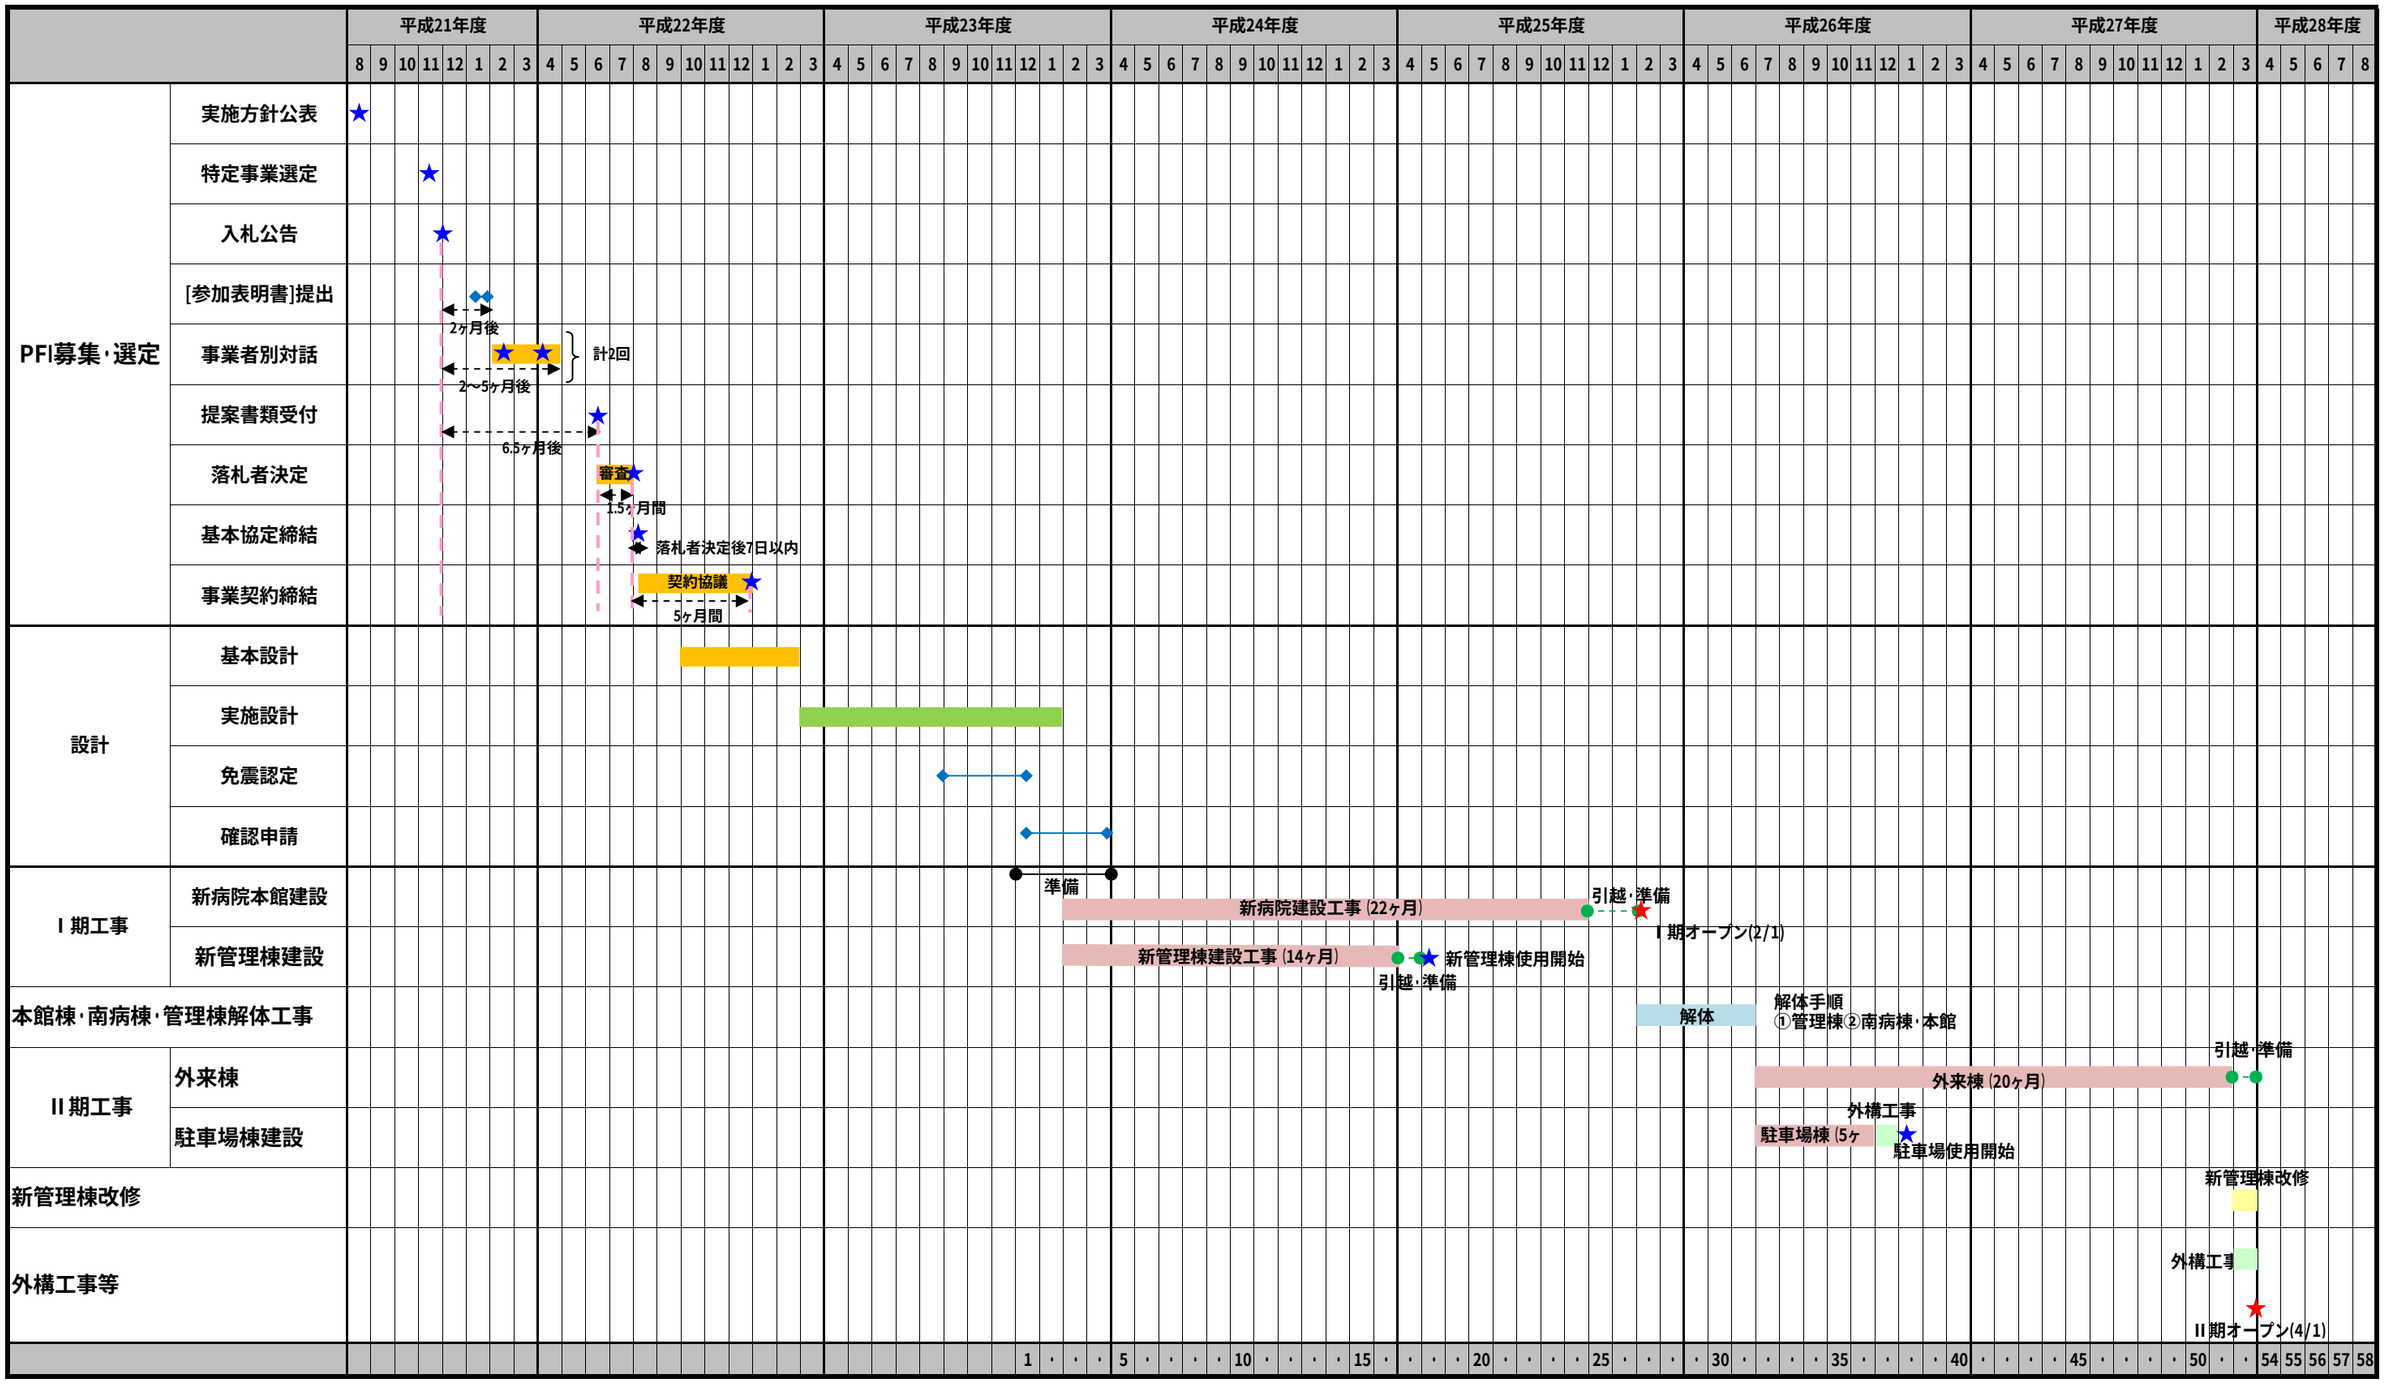
平成21年度
平成22年度
平成23年度
平成24年度
平成25年度
平成26年度
平成27年度
平成28年度
8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
PFI募集･選定
実施方針公表
特定事業選定
入札公告
[参加表明書]提出
2ヶ月後
事業者別対話
計2回
2～5ヶ月後
提案書類受付
6.5ヶ月後
落札者決定
審査
1.5ヶ月間
基本協定締結
落札者決定後7日以内
事業契約締結
契約協議
5ヶ月間
設計
基本設計
実施設計
免震認定
確認申請
準備
Ⅰ期工事
新病院本館建設
新病院建設工事（22ヶ月）
引越･準備
Ⅰ期オープン(2/1)
新管理棟建設
新管理棟建設工事（14ヶ月）
新管理棟使用開始
引越･準備
本館棟･南病棟･管理棟解体工事
解体
解体手順
①管理棟②南病棟･本館
Ⅱ期工事
外来棟
引越･準備
外来棟（20ヶ月）
駐車場棟建設
外構工事
駐車場棟（5ヶ
駐車場使用開始
新管理棟改修
新管理棟改修
外構工事等
外構工事
Ⅱ期オープン(4/1)
1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 54 55 56 57 58
